

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

Identificação da Empresa: **CSG ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 01.027.728/0001-70

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA – JOSÉ GREGÓRIO – ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.

Data da Abertura: 03/08/2022.

Hora da Abertura: 10:00hs.

LOCAL: 5ª AVENIDA DO CAB (CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA), EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 1º ANDAR, SALA 119, NORTE, SALVADOR-BAHIA, CEP 41.745-971, A/C NÚCLEO DE LICITAÇÃO.

PROPOSTA COMERCIAL

(71) 3342-8181
www.csngenharia.com.br
faleconosco@csngenharia.com.br
Av. Tancredo Neves, 939, Sala 1001
Edf. Esplanada Tower - Salvador - Bahia

INDICE

1- PROPOSTA DE PREÇO


2- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


3- PLANEJAMENTO INTEGRAL DA OBRA





1- PROPOSTA DE PREÇO





PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
CONCORRÊNCIA
NÚMERO: 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA – JOSÉ GREGÓRIO – ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.

A infra firmada através de representante habilitado, vem apresentar a essa Comissão Especial de Licitação proposta para prestação dos serviços acima identificados, declarando expressamente:

1. Que para executar os serviços referentes a concorrência acima, objeto desta licitação, propõe o multiplicador único "K" = **0,88 (Oitenta e oito centésimos)**;
2. Que no valor encontrado pela aplicação do multiplicador único "K" proposto sobre a planilha de preços unitários do TJ, referente a obra licitada, estão incluídos todos os tributos e encargos incidentes sobre os insumos e serviços utilizados para a prestação dos serviços e todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços;
3. Que tomamos conhecimento das condições técnicas, locais e de todos os elementos necessários ao cumprimento do objeto da licitação;
4. Que o **prazo para execução dos serviços é de 195 (cento e noventa e cinco) dias** corridos.
5. Que o **prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias**;
6. Que se submete a todas as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se totalmente às disposições nele contidas.
7. Indicamos o representante **Sr. Paulo Luis de Sousa** portadora da Carteira de **Identidade nº 1762778-89** do **CPF nº 096.602.595-49**, com atribuições de **Gerente de Contrato**, que terá plenos poderes de decisão por parte da empresa.

Atenciosamente,
Salvador, 03 de agosto de 2022.


CSG ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.027.728/0001-70

Paulo Luis de Sousa – Rep. Legal

CREA/BA: 15813/D

RG: 1.762.778-89 – SSP/BA

CPF: 096.602.595-49

(71) 3342-8181
www.csengenhenharia.com.br
faleconosco@csengenhenharia.com.br
Av. Tancredo Neves, 939, Sala 1001
Edf. Esplanada Tower - Salvador - Bahia

2- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
 LOCAL: ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA - JOSÉ GREGÓRIO - ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA
 DATA: 03/08/2022



		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180 D	195 D	VALOR	0,88	VALOR COM KAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR PREVISTO	374.823,81	-	-	-	-	-	374.823,81		329.844,95
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	VALOR PREVISTO	242.095,48	-	-	-	-	-	242.095,48		213.044,02
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	VALOR PREVISTO	16.103,88	-	-	-	-	-	16.103,88		14.171,41
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
4	MÓDULO 01 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	54.707,18	49.909,09	-	-	-	-	104.616,26		92.062,31
		PERCENTUAL PREVISTO	52,29%	47,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
4.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	13.919,24	-	-	-	-	-	13.919,24		12.248,93
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
4.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS E CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	37.747,55	37.747,55	-	-	-	-	75.495,10		66.435,69
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
4.3	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS E CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	3.040,38	12.161,53	-	-	-	-	15.201,92		13.377,69
		PERCENTUAL PREVISTO	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
5	MÓDULO 01 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	42.359,87	95.678,56	-	-	-	138.038,43		121.473,82
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,69%	69,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
5.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	25.239,27	25.239,27	-	-	-	50.478,54		44.421,12
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
5.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	17.120,60	39.948,07	-	-	-	57.068,68		50.220,44
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

(Handwritten signatures and initials)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
LOCAL: ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA – JOSÉ GREGÓRIO – ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA
DATA: 03/08/2022



		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	0,88	VALOR COM KAPA		
5.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	30.491,22	-	-	-	-	30.491,22	-	26.832,27	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
6	MÓDULO 02 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	36.888,96	30.730,45	-	-	-	-	-	67.619,41	-	59.505,08	
		PERCENTUAL PREVISTO	54,55%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
6.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	10.030,81	-	-	-	-	-	-	10.030,81	-	8.827,11	
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
6.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS E CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	23.953,93	23.953,93	-	-	-	-	-	47.907,87	-	42.158,93	
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
6.3	REATERRO E BOTA-FORA	VALOR PREVISTO	2.904,22	6.776,52	-	-	-	-	-	9.680,74	-	8.519,05	
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
7	MÓDULO 02 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	34.874,61	76.492,50	-	-	-	-	111.367,11	-	98.003,06	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	31,31%	68,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
7.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	22.385,45	22.385,45	-	-	-	-	44.770,90	-	39.398,39	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
7.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	12.489,16	29.141,37	-	-	-	-	41.630,53	-	36.634,87	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
7.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	24.965,68	-	-	-	-	24.965,68	-	21.969,80	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
8	MÓDULO 03 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	43.507,83	31.030,00	-	-	-	-	-	74.537,83	-	65.593,29	
		PERCENTUAL PREVISTO	58,37%	41,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	

Handwritten signatures and initials



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
 LOCAL: ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA – JOSÉ GREGÓRIO – ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA
 DATA: 03/08/2022



		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	0,88	VALOR COM KAPA
8.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	16.285,03	-	-	-	-	-	16.285,03		14.330,83
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
8.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS E CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	24.367,40	24.367,40	-	-	-	-	48.734,80		42.886,62
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
8.3	REATERRO E BOTA-FORA	VALOR PREVISTO	2.855,40	6.662,60	-	-	-	-	9.518,00		8.375,84
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
9	MÓDULO 03 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	29.990,17	64.002,68	-	-	-	93.992,85		82.713,71
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	31,91%	68,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
9.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	20.318,17	20.318,17	-	-	-	40.636,34		35.759,98
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
9.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	9.672,00	22.568,00	-	-	-	32.240,01		28.371,21
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
9.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	21.116,50	-	-	-	21.116,50		18.582,52
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
10	PISOS E REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	43.910,94	43.910,94	-	87.821,88		77.283,25
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
11	PAREDES E PAINÉIS	VALOR PREVISTO	-	-	-	388.714,22	-	-	388.714,22		342.068,51
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
12	ACESSÓRIOS E FERRAGENS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	17.330,94	17.330,94	34.661,89	30.502,46
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

CSG ENGENHARIA LTDA
 Resp. Técnico: Paulo Luis de Sousa
 CREA/BA: 15.813-D



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
LOCAL: ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA – JOSÉ GREGÓRIO – ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA
DATA: 03/08/2022



		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	0,88	VALOR COM KAPA		
13	ESQUADRIAS E VIDROS	VALOR PREVISTO	-	-	-	141.643,22	141.643,22	-	-	283.286,44	-	249.292,07	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
14	FORRO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	26.750,36	26.750,36	53.500,71	-	47.080,62	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
15	REVESTIMENTO DE FACHADA	VALOR PREVISTO	-	-	-	125.682,67	502.730,69	-	-	628.413,36	-	553.003,76	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	VALOR PREVISTO	10.457,90	31.373,70	31.373,70	31.373,70	41.831,60	31.373,70	31.373,70	209.157,98	-	184.059,02	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
16.1	REDE DE ÁGUA FRIA	VALOR PREVISTO	1.630,68	4.892,05	4.892,05	4.892,05	6.522,74	4.892,05	4.892,05	32.613,69	-	28.700,05	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
16.2	REDE DE ESGOTO	VALOR PREVISTO	1.503,48	4.510,44	4.510,44	4.510,44	6.013,92	4.510,44	4.510,44	30.069,58	-	26.461,23	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
16.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO	VALOR PREVISTO	1.898,71	5.696,14	5.696,14	5.696,14	7.594,85	5.696,14	5.696,14	37.974,25	-	33.417,34	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
16.4	CAIXAS SIFONADAS E RALOS	VALOR PREVISTO	34,44	103,32	103,32	103,32	137,75	103,32	103,32	688,77	-	606,12	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
16.5	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	VALOR PREVISTO	2.914,92	8.744,76	8.744,76	8.744,76	11.659,68	8.744,76	8.744,76	58.298,40	-	51.302,59	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
16.6	RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS	VALOR PREVISTO	2.475,66	7.426,99	7.426,99	7.426,99	9.902,66	7.426,99	7.426,99	49.513,29	-	43.571,70	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR PREVISTO	17.976,98	53.930,94	53.930,94	53.930,94	71.907,92	53.930,94	53.930,94	359.539,58	-	316.394,83	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%

Handwritten initials and signatures in the bottom left corner.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
 LOCAL: ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA – JOSÉ GREGÓRIO – ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA
 DATA: 03/08/2022



			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	0,88	VALOR COM KAPA
17.1	LUMINÁRIAS	VALOR PREVISTO	4.977,15	14.931,44	14.931,44	14.931,44	19.908,59	14.931,44	14.931,44	99.542,95		87.597,80
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2	ILUMINAÇÃO	VALOR PREVISTO	3.462,89	10.388,67	10.388,67	10.388,67	13.851,56	10.388,67	10.388,67	69.257,82		60.946,88
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.3	REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS	VALOR PREVISTO	1.122,51	3.367,53	3.367,53	3.367,53	4.490,03	3.367,53	3.367,53	22.450,17		19.756,15
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.4	REDE DE BAIXA TENSÃO	VALOR PREVISTO	1.409,41	4.228,23	4.228,23	4.228,23	5.637,64	4.228,23	4.228,23	28.188,21		24.805,62
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5	INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA	VALOR PREVISTO	219,23	657,70	657,70	657,70	876,93	657,70	657,70	4.384,66		3.858,50
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.6	ALIMENTADORES	VALOR PREVISTO	3.564,22	10.692,66	10.692,66	10.692,66	14.256,88	10.692,66	10.692,66	71.284,41		62.730,28
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.7	ELETRICA - EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	3.221,57	9.664,71	9.664,71	9.664,71	12.886,27	9.664,71	9.664,71	64.431,37		56.699,61
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA	VALOR PREVISTO	2.985,47	8.956,41	8.956,41	8.956,41	11.941,89	8.956,41	8.956,41	59.709,43		52.544,30
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1	REDE - LÓGICA E TELEFONIA	VALOR PREVISTO	1.282,19	3.846,57	3.846,57	3.846,57	5.128,76	3.846,57	3.846,57	25.643,78		22.566,53
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2	INFRA ESTRUTURA - LÓGICA TELEFONIA E CFTV	VALOR PREVISTO	378,73	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.514,93	1.136,20	1.136,20	7.574,67		6.665,71
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.3	LÓGICA - EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	878,47	2.635,41	2.635,41	2.635,41	3.513,89	2.635,41	2.635,41	17.569,43		15.461,10
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	

Handwritten signatures and initials.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
 LOCAL: ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA – JOSÉ GREGÓRIO – ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA
 DATA: 03/08/2022



			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	0,88	VALOR COM KAPA	
18.4	REDE DE QTV	VALOR PREVISTO	146,06	438,17	438,17	438,17	584,23	438,17	438,17	2.921,16		2.570,62	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18.5	INFRA ESTRUTURA - SOM, VIDEO E CHAMADA DE SENHA	VALOR PREVISTO	130,75	392,24	392,24	392,24	522,99	392,24	392,24	2.614,94		2.301,15	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18.6	ENTRADA LOGICA E TELEFONIA	VALOR PREVISTO	169,27	507,82	507,82	507,82	677,09	507,82	507,82	3.385,45		2.979,20	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	2.361,11	7.083,33	7.083,33	7.083,33	9.444,44	7.083,33	7.083,33	47.222,22		41.555,55	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19.1	INFRA ESTRUTURA - AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	2.146,59	6.439,78	6.439,78	6.439,78	8.586,37	6.439,78	6.439,78	42.931,85		37.780,03	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19.2	DRENO - AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	214,52	643,56	643,56	643,56	858,07	643,56	643,56	4.290,37		3.775,53	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	12.909,21	51.636,85	-	-	64.546,06		56.800,53	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.1	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	11.104,15	44.416,61	-	-	55.520,76		48.858,27	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%					100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.2	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	VALOR PREVISTO	-	-	-	794,88	3.179,54	-	-	3.974,42		3.497,49	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.3	EXTINTORES	VALOR PREVISTO	-	-	-	1.010,18	4.040,70	-	-	5.050,88		4.444,77	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	13.120,04	19.680,06	26.240,08	6.560,02	65.600,19		57.728,17	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

Handwritten initials/signature

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	0,88	VALOR COM KAPA	
22	GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	VALOR PREVISTO	-	-	-	60.872,70	97.559,26	116.745,24	29.186,31	304.363,51		267.839,89	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	32,05%	38,36%	9,59%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22.1	INFRA-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	2.500,08	10.000,33	-	-	12.500,41		11.000,36	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%					100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22.2	SISTEMA FOTOVOLTAICO	VALOR PREVISTO	-	-	-	58.372,62	87.558,93	116.745,24	29.186,31	291.863,10		256.839,53	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
23	ARREMATAS E SOLEIRAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	2.624,78	2.624,78	3.499,70	8.749,25		7.699,34	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
24	PINTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	13.153,48	19.730,22	26.306,95	6.576,74	65.767,38		57.875,29	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
25	COBERTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	35.893,80	179.469,00	143.575,20	358.937,99		315.865,43	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
26	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	31.734,30	31.734,30		27.926,18	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
27	SINALIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	9.783,07	9.783,07		8.609,10	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
28	LIMPEZA GERAL	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	5.416,32	5.416,32		4.766,36	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	VALOR PREVISTO	-	-	-	153.311,43	383.278,57	153.311,43	76.655,71	766.957,14		674.570,28	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			0,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.1	ALVENARIA	VALOR PREVISTO	-	-	-	53.990,88	134.977,20	53.990,88	26.995,44	269.954,41		237.559,88	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
LOCAL: ZONA URBANA ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA – JOSÉ GREGÓRIO – ROGACIANO BARBOSA, S/N, MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA
DATA: 03/08/2022



		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	0,88	VALOR COM KAPA	
29.2	REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	10.065,23	25.163,07	10.065,23	5.032,61	50.326,14	-	44.287,00
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.3	PINTURA ÁREA EXTERNA	VALOR PREVISTO	-	-	-	6.672,99	16.682,48	6.672,99	3.336,50	33.364,96	-	29.361,16
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.4	FECHAMENTOS EXTERNOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	13.431,24	33.578,09	13.431,24	6.715,62	67.156,18	-	59.097,44
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.5	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E DEPOSITÁRIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	29.125,30	72.813,25	29.125,30	14.562,65	145.626,50	-	128.151,32
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.6	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO E CASA DE BOMBAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	11.479,56	28.698,89	11.479,56	5.739,78	57.397,78	-	50.510,05
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	VALOR PREVISTO	-	-	-	24.362,07	60.905,16	24.362,07	12.181,03	121.810,33	-	107.193,09
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.8	ELEMENTOS DECORATIVOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	702,87	1.757,18	702,87	351,44	3.514,37	-	3.092,65
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.9	PAISAGISMO	VALOR PREVISTO	-	-	-	3.481,30	8703,24	3.481,30	1.740,65	17.406,48	-	15.317,70
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ADMINISTRAÇÃO	VALOR PREVISTO	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	18.837,91	244.892,84	-	215.505,70
		PERCENTUAL PREVISTO	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	7,69%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAL	VALOR PREVISTO	839.584,43	357.914,39	375.193,95	1.092.338,11	1.471.490,03	687.798,97	477.250,96	5.301.570,84	-	4.665.382,34	
	PERCENTUAL PREVISTO	15,84%	6,75%	7,08%	20,60%	27,76%	12,97%	9,00%	TOTAL DA OBRA	-	100%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	15,84%	22,59%	29,66%	50,27%	78,02%	91,00%	100,00%	-	-	-	
	VALOR PREVISTO COM KAPA	738.834,30	314.964,66	330.170,68	961.257,54	1.294.911,23	605.263,09	419.980,84	4.665.382,34	-	-	



3- PLANEJAMENTO INTEGRAL DA OBRA


3.1- CRONOGRAMA EXECUTIVO



NOVA FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
CRONOGRAMA TÁTICO/ESTRATÉGICO DE CONSTRUÇÃO



ID	WBS	Nome	Início	Conclusão	Duração	Predecessoras	Set	Out	Nov	Dez	2023 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
1	1	NOVA FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO	Seg 03/10/22	Sex 14/04/23	135 dias										
2	1.1	OBRA	Seg 03/10/22	Sex 14/04/23	135 dias										
3	1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Seg 03/10/22	Sex 21/10/22	14 dias										
4	1.1.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	Seg 03/10/22	Sex 28/10/22	19 dias										
5	1.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	Ter 18/10/22	Sex 21/10/22	4 dias										
6	1.1.4	MÓDULO 01 - INFRA ESTRUTURA	Seg 24/10/22	Sex 11/11/22	14 dias										
7	1.1.4.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E PREPARO	Seg 24/10/22	Seg 31/10/22	6 dias										
8	1.1.4.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS E CINTAMENTO	Ter 25/10/22	Qui 10/11/22	12 dias										
9	1.1.4.3	REATERRO E BOTA-FORA	Qua 26/10/22	Sex 11/11/22	12 dias										
10	1.1.5	MÓDULO 01 - SUPER-ESTRUTURA	Qua 23/11/22	Sex 16/12/22	18 dias										
11	1.1.5.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	Qua 23/11/22	Qui 08/12/22	12 dias										
12	1.1.5.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	Seg 28/11/22	Ter 13/12/22	12 dias										
13	1.1.5.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	Qui 01/12/22	Sex 16/12/22	12 dias										
14	1.1.6	MÓDULO 02 - INFRA ESTRUTURA	Seg 24/10/22	Qua 09/11/22	12 dias										
15	1.1.6.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E PREPARO	Seg 24/10/22	Seg 31/10/22	6 dias										
16	1.1.6.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS E CINTAMENTO	Ter 25/10/22	Ter 08/11/22	10 dias										
17	1.1.6.3	REATERRO E BOTA-FORA	Qua 26/10/22	Qua 09/11/22	10 dias										
18	1.1.7	MÓDULO 02 - SUPER-ESTRUTURA	Qui 24/11/22	Seg 19/12/22	18 dias										
19	1.1.7.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	Qui 24/11/22	Qua 07/12/22	10 dias										
20	1.1.7.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	Seg 28/11/22	Sex 09/12/22	10 dias										
21	1.1.7.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	Ter 06/12/22	Seg 19/12/22	10 dias										
22	1.1.8	MÓDULO 03 - INFRA ESTRUTURA	Seg 24/10/22	Qua 09/11/22	12 dias										
23	1.1.8.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E PREPARO	Seg 24/10/22	Seg 31/10/22	6 dias										
24	1.1.8.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS E CINTAMENTO	Ter 25/10/22	Ter 08/11/22	10 dias										
25	1.1.8.3	REATERRO E BOTA-FORA	Qua 26/10/22	Qua 09/11/22	10 dias										
26	1.1.9	MÓDULO 03 - SUPER-ESTRUTURA	Ter 22/11/22	Qua 21/12/22	22 dias										
27	1.1.9.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	Ter 22/11/22	Sex 09/12/22	14 dias										
28	1.1.9.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	Seg 28/11/22	Qui 15/12/22	14 dias										
29	1.1.9.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	Sex 02/12/22	Qua 21/12/22	14 dias										
30	1.1.10	PISOS E REVESTIMENTOS	Seg 09/01/23	Sex 24/02/23	34 dias										
31	1.1.11	PAREDES E PAINÉIS	Seg 02/01/23	Ter 31/01/23	22 dias										
32	1.1.12	ACESSÓRIOS E FERRAGENS	Qui 23/03/23	Qua 12/04/23	14 dias										
33	1.1.13	ESQUADRIAS E VIDROS	Seg 16/01/23	Qui 23/02/23	28 dias										
34	1.1.14	FORRO	Seg 13/03/23	Qui 06/04/23	19 dias										
35	1.1.15	REVESTIMENTO DE FACHADA	Qua 11/01/23	Sex 24/02/23	32 dias										
36	1.1.16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Qui 20/10/22	Ter 11/04/23	120 dias										
37	1.1.16.1	REDE DE ÁGUA FRIA	Qui 20/10/22	Ter 11/04/23	120 dias	7CI-8 dias;15CI-8 dias;23CI-8 dias									
38	1.1.16.2	REDE DE ESGOTO	Qui 20/10/22	Ter 11/04/23	120 dias	7CI-8 dias;15CI-8 dias;23CI-8 dias									
39	1.1.16.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										
40	1.1.16.4	CAIXAS SIFONADAS E RALOS	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										
41	1.1.16.5	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	Qui 20/10/22	Ter 11/04/23	120 dias	7CI-8 dias;15CI-8 dias;23CI-8 dias									
42	1.1.16.6	RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										
43	1.1.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										
44	1.1.17.1	LUMINÁRIAS	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias	7II+5 dias;15II+5 dias;23II+5 dias									
45	1.1.17.2	ILUMINAÇÃO	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										
46	1.1.17.3	REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										
47	1.1.17.4	REDE DE BAIXA TENSÃO	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										
48	1.1.17.4.1	INFRA ESTRUTURA - FORÇA COMUM	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										
49	1.1.17.4.2	REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS DE INFORMÁTICA	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias										



NOVA FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO
CRONOGRAMA TÁTICO/ESTRATÉGICO DE CONSTRUÇÃO



ID	WBS	Nome	Início	Conclusão	Duração	Predecessoras	2023											
							Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai			
50	1.1.17.5	INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		46II											
51	1.1.17.6	ALIMENTADORES	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		50II											
52	1.1.17.7	ELETRICA - EQUIPAMENTOS	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		51II											
53	1.1.18	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias													
54	1.1.18.1	REDE - LÓGICA E TELEFONIA	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		55II											
55	1.1.18.2	INFRA ESTRUTURA - LÓGICA TELEFONIA E CFTV	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		50II											
56	1.1.18.3	LÓGICA - EQUIPAMENTOS	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		54II											
57	1.1.18.4	REDE DE CFTV	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		55II											
58	1.1.18.5	INFRA ESTRUTURA - SOM, VIDEO E CHAMADA DE SENHA	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		55II											
59	1.1.18.6	ENTRADA LOGICA E TELEFONIA	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		58II											
60	1.1.19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias													
61	1.1.19.1	INFRA ESTRUTURA - AR CONDICIONADO	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		55II											
62	1.1.19.2	DRENO - AR CONDICIONADO	Seg 31/10/22	Qua 05/04/23	110 dias		61II											
63	1.1.20	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	Qua 04/01/23	Ter 14/02/23	30 dias													
64	1.1.20.1	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	Qua 04/01/23	Ter 14/02/23	30 dias													
65	1.1.20.2	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Seg 30/01/23	Sex 03/02/23	5 dias													
66	1.1.20.3	EXTINTORES	Seg 30/01/23	Sex 03/02/23	5 dias													
67	1.1.21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Seg 16/01/23	Qui 06/04/23	58 dias													
68	1.1.22	GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Seg 30/01/23	Ter 11/04/23	50 dias													
69	1.1.22.1	INFRA-ESTRUTURA	Seg 30/01/23	Ter 07/02/23	7 dias													
70	1.1.22.2	SISTEMA FOTOVOLTAICO	Qua 01/02/23	Ter 11/04/23	48 dias													
71	1.1.23	ARREMATAS E SÓLEIRAS	Seg 20/02/23	Ter 11/04/23	35 dias													
72	1.1.24	PINTURA	Seg 03/10/22	Ter 20/12/22	54 dias													
73	1.1.25	COBERTURA	Ter 07/02/23	Ter 11/04/23	44 dias													
74	1.1.26	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Seg 03/04/23	Qua 12/04/23	7 dias													
75	1.1.27	SINALIZAÇÃO	Ter 20/12/22	Qua 21/12/22	2 dias													
76	1.1.28	LIMPEZA GERAL	Sex 31/03/23	Qua 12/04/23	8 dias													
77	1.1.29	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	Seg 09/01/23	Sex 14/04/23	68 dias													
78	1.1.29.1	ALVENARIA	Seg 09/01/23	Qua 05/04/23	62 dias													
79	1.1.29.2	REVESTIMENTOS	Qua 11/01/23	Seg 10/04/23	62 dias													
80	1.1.29.3	PINTURA ÁREA EXTERNA	Ter 17/01/23	Sex 14/04/23	62 dias													
81	1.1.29.4	FECHAMENTOS EXTERNOS	Seg 09/01/23	Qua 05/04/23	62 dias													
82	1.1.29.5	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E DEPOSITÁRIO	Seg 09/01/23	Qua 05/04/23	62 dias													
83	1.1.29.6	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO E CASA DE BOMBAS	Seg 09/01/23	Qua 05/04/23	62 dias													
84	1.1.29.7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	Qua 11/01/23	Seg 10/04/23	62 dias													
85	1.1.29.8	ELEMENTOS DECORATIVOS	Qua 11/01/23	Seg 10/04/23	62 dias													
86	1.1.29.9	PAISAGISMO	Seg 23/01/23	Sex 14/04/23	58 dias													
87	1.1.30	ADMINISTRAÇÃO	Seg 03/10/22	Sex 14/04/23	135 dias													
88	1.2	Entrega da Obra	Sex 14/04/23	Sex 14/04/23	0 dias													



CSG
ENGENHARIA


3.2- PLANO DE AQUISIÇÕES

9

CA
[Handwritten signature]


PLANO DE AQUISIÇÕES

Suprimentos			
Material		Data aquisição/compr	Data chegada obra Folga 20 dias úteis
1.1.1	Suprimentos INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
1.1.1.1	Suprimentos Forma Fundação	05/10/22	13/10/22
1.1.1.2	Suprimentos Armação Fundação	05/10/22	14/10/22
1.1.1.3	Suprimentos Concreto Fundação	05/10/22	17/10/22
1.1.1.4	Suprimentos Forma Estrutura	05/10/22	24/10/22
1.1.1.5	Suprimento Armação Estrutura	05/10/22	27/10/22
1.1.1.6	Suprimento Concreto Estrutura	10/10/22	01/11/22
1.1.2	Suprimentos PISOS E REVESTIMENTOS		
1.1.2.1	Suprimentos piso cerâmico	31/10/22	05/12/22
1.1.2.2	Suprimentos Revestimento para piso ou parede em granito verde ubat	31/10/22	16/01/23
1.1.3	Suprimento PAREDES E PAINÉIS		
1.1.3.1	Suprimentos Parede com Placas de Gesso Acartonado	31/10/22	19/12/22
1.1.3.2	Suprimentos Manta em lã de rocha	14/11/22	19/12/22
1.1.3.3	Suprimentos Alvenaria de Bloco Cerâmico	01/11/22	23/11/22
1.1.3.4	Suprimentos Divisória em compensado naval	05/12/22	19/12/22
1.1.3.5	Suprimentos Rodapé em granito	31/10/22	26/12/22
1.1.3.6	Suprimentos Cerâmica Interna	31/10/22	16/01/23
1.1.4	Suprimentos ACESSÓRIOS E FERRAGENS		
1.1.4.1	Suprimentos Mola hidráulica para porta	01/02/23	07/03/23
1.1.4.2	Suprimentos Persiana vertical em tecido de nylon	01/03/23	10/04/23
1.1.5	Suprimentos ESQUADRIAS E VIDROS		
1.1.5.1	Suprimentos Esquadrias metálicas	31/10/22	19/12/22
1.1.5.2	Suprimentos Esquadrias de vidro	31/10/22	19/12/22
1.1.5.3	Suprimentos Esquadrias de madeira	01/12/22	16/01/23
Suprimentos			
Material		Data aquisição/compr	Data chegada obra Folga 20 dias úteis
1.1.6	Suprimentos FORRO		
1.1.6.1	Suprimentos Forro acústico em placas	31/10/22	12/01/23
1.1.6.2	Suprimentos Forro de drywall	31/10/22	26/01/23
1.1.7	Suprimentos REVESTIMENTO DE FACHADA		
1.1.7.1	Suprimentos Junta de dilatação	31/10/22	12/12/22
1.1.7.2	Suprimentos Revestimento Metálico em alumínio composto	31/10/22	16/01/23
1.1.7.3	Suprimentos Cerâmica Externa	31/10/22	19/12/22
1.1.7.4	Suprimentos Brise metálico de alumínio	09/11/22	16/01/23
1.1.8	Suprimentos INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
1.1.8.1	Suprimentos Rede de Água Fria	05/10/22	13/10/22
1.1.8.2	Suprimentos Rede de Esgoto	05/10/22	13/10/22
1.1.8.3	Suprimentos Caixas de inspeção	05/10/22	13/10/22
1.1.8.4	Suprimentos Caixas Sifonadas e Ralos	05/10/22	13/10/22
1.1.8.5	Suprimentos Rede de Águas Pluviais	05/10/22	13/10/22
1.1.8.6	Suprimentos Reservatórios e Casa de Bombas	01/11/22	23/11/22
1.1.9	Suprimentos INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1.9.1	Suprimentos Luminárias		
1.1.9.1.1	Suprimentos Postes	05/10/22	31/10/22
1.1.9.1.2	Suprimentos Luminárias	01/12/22	26/01/23
1.1.9.2	Suprimentos Iluminação		
1.1.9.2.1	Suprimentos Eletrodutos	05/10/22	16/12/22
1.1.9.2.2	Suprimentos Cabos	01/11/22	11/01/23
1.1.9.2.3	Suprimentos Interruptores	01/12/22	17/02/23

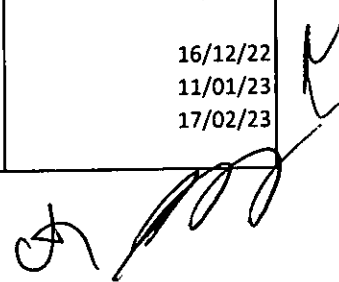

Suprimentos		
Material	Data aquisição/compr	Data chegada obra Folga 20 dias úteis
1.1.9.3 Suprimentos Rede de Baixa Tensão - Tomadas		
1.1.9.3.1 Suprimentos Eletrodutos	05/10/22	19/12/22
1.1.9.3.2 Suprimentos Cabos	01/11/22	12/01/23
1.1.9.3.3 Suprimentos Tomadas	01/12/22	17/02/23
1.1.9.4 Suprimentos Infra Estutura - Força Comum		
1.1.9.4.1 Suprimentos Eletrocalha	05/10/22	05/01/23
1.1.9.5 Suprimentos Rede de Baixa Tensão - Tomadas de Informática		
1.1.9.5.1 Suprimentos Eletrodutos	05/10/22	19/12/22
1.1.9.5.2 Suprimentos Cabos	01/11/22	12/01/23
1.1.9.5.3 Suprimentos Tomadas	01/12/22	17/02/23
1.1.9.6 Suprimentos Infra Estutura - Força Estabilizada		
1.1.9.6.1 Suprimentos Eletrocalha	05/10/22	12/01/23
1.1.9.7 Suprimentos Alimentadores		
1.1.9.7.1 Suprimentos Eletrodutos	05/10/22	28/12/22
1.1.9.7.2 Suprimentos Cabos	01/11/22	19/01/23
1.1.9.7.3 Suprimentos Quadros	01/12/22	06/02/23
1.1.9.8 Suprimentos No break	01/12/22	10/02/23
1.1.10 Suprimentos INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA		
1.1.10.1 Suprimentos Rede - Lógica e Telefonia	05/10/22	29/12/22
1.1.10.2 Suprimentos Eletrocalha	05/10/22	19/01/23
1.1.10.3 Suprimentos Equipamentos lógica	01/11/22	27/02/23
1.1.10.4 Suprimentos Rede de CFTV	01/11/22	19/12/22
1.1.10.5 Suprimentos Rede Som, video e chamada de senha	01/11/22	19/12/22
1.1.10.6 Suprimentos Entrada lógica e telefonia	01/11/22	19/12/22
Suprimentos		
Material	Data aquisição/compr	Data chegada obra Folga 20 dias úteis
1.1.11 Suprimentos INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
1.1.11.1 Suprimentos Eletrodutos	05/10/22	19/12/22
1.1.11.2 Suprimentos Cabos	01/11/22	30/12/22
1.1.11.3 Suprimentos Aparelho Split	01/12/22	06/03/23
1.1.11.4 Suprimentos Dreno - Ar Condicionado	16/11/22	15/12/22
1.1.12 Suprimentos INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
1.1.12.1 Suprimentos Detecção e Alarme de incêndio	16/11/22	15/12/22
1.1.12.2 Suprimentos iluminação e sinalização de emergência	01/02/22	02/03/23
1.1.12.3 Suprimentos Extintores	01/02/22	08/03/23
1.1.13 Suprimentos SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
1.1.13.1 Suprimentos Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas	01/11/22	28/12/22
1.1.14 Suprimentos GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		
1.1.14.1 Suprimentos Geração de Energia Fotovoltaica	01/11/22	18/01/23
1.1.15 Suprimentos ARREMATES E SOLEIRAS		
1.1.15.1 Suprimentos Soleira em granito	31/10/22	13/02/23
1.1.15.2 Suprimentos Divisória em granito branco fortaleza	31/10/22	15/02/23
1.1.16 Suprimentos PINTURA		
1.1.16.1 Suprimentos Pintura Interna	01/11/22	06/01/23
1.1.17 Suprimentos COBERTURA		
1.1.17.1 Suprimentos Rufo de concreto armado	01/11/22	15/12/22
1.1.17.2 Suprimentos Estrutura Metálica Galpões em Pórticos	01/11/22	18/01/23
1.1.17.3 Suprimentos Telhamento com telha metálica	01/11/22	01/02/23
1.1.17.4 Suprimentos Impermeabilização	01/11/22	22/12/22


CSG




PLANO DE AQUISIÇÕES

Suprimentos		
Material	Data aquisição/compr	Data chegada obra Folga 20 dias úteis
1.1.18	Suprimentos LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	
1.1.18.1	Suprimentos Louças	01/11/22 17/02/23
1.1.18.2	Suprimentos Acessorios	01/11/22 27/02/23
1.1.18.3	Suprimentos Bancada	31/10/22 17/02/23
1.1.19	Suprimentos SINALIZAÇÃO	
1.1.19.1	Suprimentos Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha	31/10/22 17/02/23
1.1.20	Suprimentos LIMPEZA GERAL	
1.1.20.1	Suprimentos Limpeza	05/01/23 07/03/23
1.1.21	Suprimentos URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	
1.1.21.1	Suprimentos Calha semi-circular em concreto pré-moldado	01/11/22 27/12/22
1.1.21.2	Suprimentos Pintura externa	01/11/22 10/02/23
1.1.21.3	Suprimentos Gradil em aluminio	01/12/22 09/01/23
1.1.21.4	Suprimentos Corrimão em aço inox	01/12/22 17/01/23
1.1.21.5	Suprimentos Concertina em aço galvanizado	01/12/22 20/01/23
1.1.21.6	Suprimentos Impermeabilização reservatórios	01/12/22 04/01/23
1.1.21.7	Suprimentos piso tátil	10/10/22 10/11/22
1.1.21.8	Suprimentos Piso Intertravado	05/11/22 05/12/22
1.1.21.9	Suprimentos Meio-fio	05/10/22 24/10/22
1.1.21.10	Suprimentos Mastro Triplo	01/01/23 02/03/23
1.1.21.11	Suprimentos Gramas e terra vegetal	01/01/23 27/02/23






3.3- HISTOGRAMA



(11) 342 8181
www.csengenhenharia.com.br
faleconosco@csengenhenharia.com.br
Av. Tancredo Neves, 939, Sala 1001
Edf. Esplanada Tower - Salvador - Bahia

Histograma

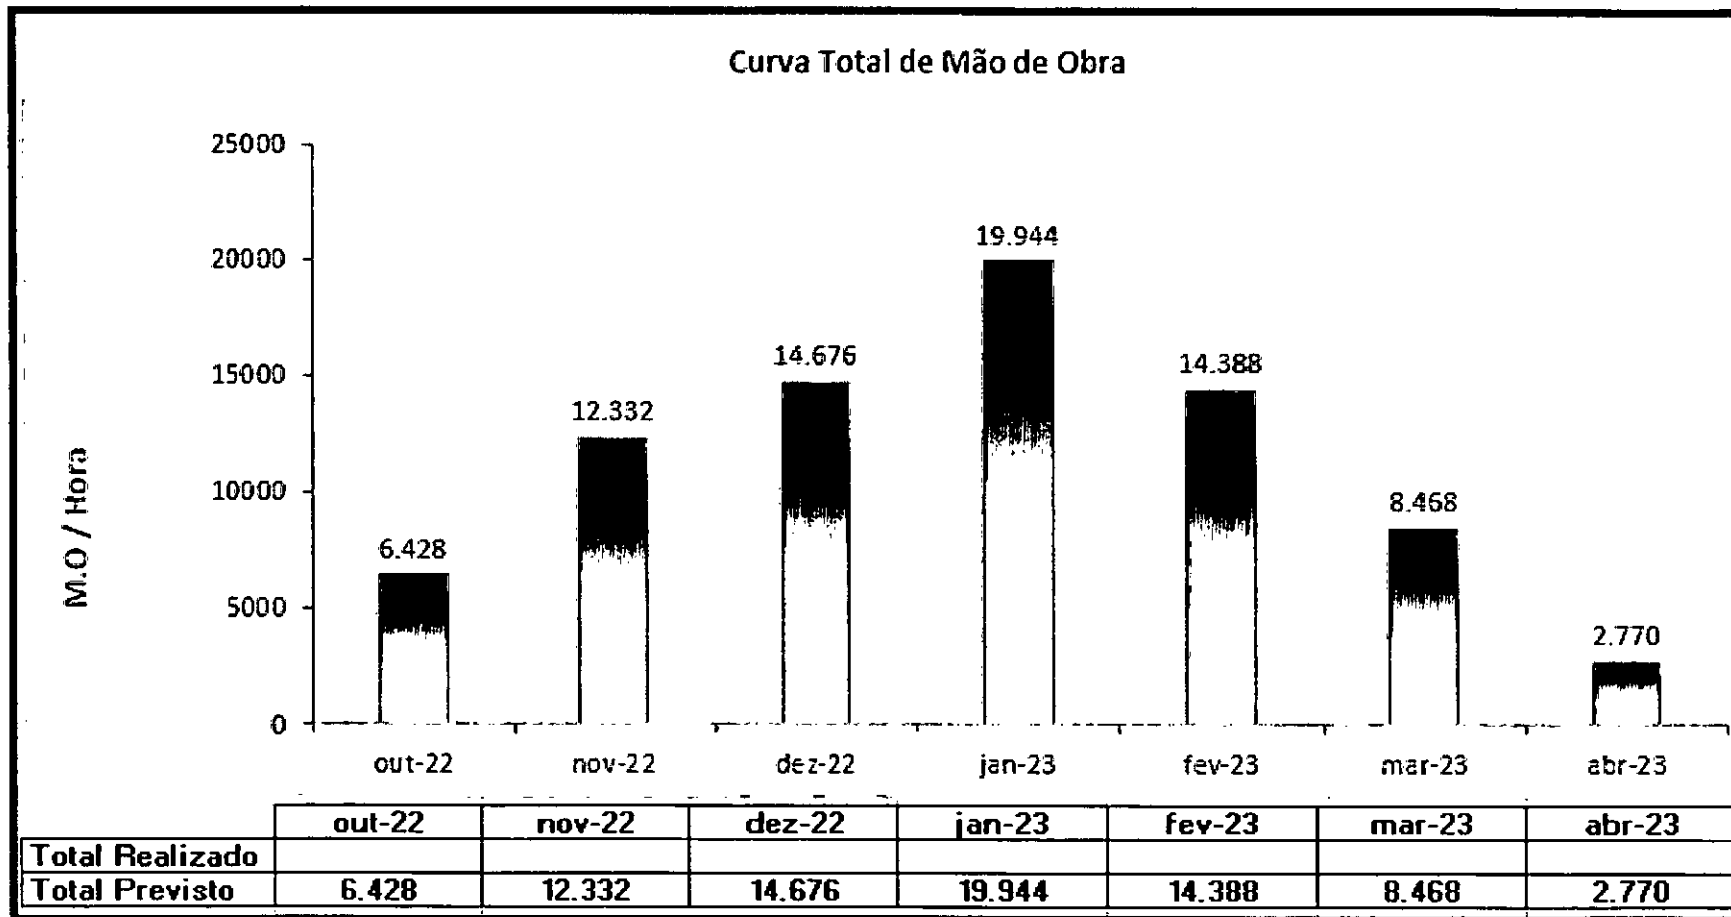

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Novo Fórum da Comarca de Lapão

Histograma





Curva Total de M.O. / Especialidade

Item	Função	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
1.0	Planilha Contratual							
1.1	ADM Local							
1.1.1	Engenheiro Civil	220	220	220	220	220	220	110
1.1.2	Encarregado Geral	220	220	220	220	220	220	110
1.1.3	Vigia Noturno	220	220	220	220	220	220	110
1.2	Produção							
1.2.1	Pedreiro	787	1089	2789	4279	2642	1102	220
1.2.2	Carpinteiro	672	1614	720	220	220		
1.2.3	Armador	307	948	622				
1.2.4	Encanador	1504	4784	5632	6056	3632	816	200
1.2.5	Eletricista	160	16	64	2000	2028	620	132
1.2.6	Pintor				32	208	2144	320
1.2.7	Gesseiro						268	268
1.2.8	Especialista drywall				128	528		
1.2.9	Impermeabilizador				160	96		
1.2.10	Montador/Serralheiro				160	1032	456	
1.2.11	Servente	1018	1901	2869	4929	2022	1002	560
1.2.12	Jardineiro						80	80
1.2.13	Operador de Betoneira	440	440	440	440	440	440	220
2.0	ADM Local Custo Indireto							
2.1	Auxiliar Administrativo	220	220	220	220	220	220	110
2.2	Auxiliar Almoxarife	220	220	220	220	220	220	110
2.3	Encarregado Elétrica	220	220	220	220	220	220	110
2.4	Tecnico Segurança	220	220	220	220	220	220	110
	Total mês	6.428	12.332	14.676	19.944	14.388	8.468	2.770

Novo Fórum da Comarca de Lagoa


3.4- ORGANOGRAMA

(71) 3542-8187
www.csengenhenaria.com.br
faleconosco@csengenhenaria.com.br
Av. Tancredo Neves, 939, Sala 1001
Edf. Esplanada Tower - Salvador - Bahia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA



• Organograma Equipe Técnica de Execução da Obra

