


REICH
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA 004/2022

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

		[ENGENHARIA COM FATOR "K"]	
ITEM 1	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO		
		K:	0,82
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	(60) DIAS [≥60]

SALVADOR/BA, 03 de Agosto de 2022.


NICOLAS MOREIRA FASCETO

Representante Legal
C.I. N.º 574565183 C.P.F. N.º 012.711.295-23

22.938.566/0001-00

REICH ENGENHARIA
R. Carlos Alberto de Oliveira, nº 186, Itinga
CEP. 42.700-000


LAURO DE FREITAS-BAHIA


MAGNO BITTENCOURT ROCHA

Representante Legal
C.I. N.º 869800922 C.P.F. N.º 010.612.365-36

Rua Carlos Alberto de Oliveira, nº 186 Lot. 08 Itinga Quadra D Bairro Itinga

CEP: 42700-130 - Lauro de Freitas - Bahia


(A)

ANEXO XI
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180 D	195 D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR PREVISTO	374.823,81							374.823,81		374.823,81
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	VALOR PREVISTO	242.095,48							242.095,48		242.095,48
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
3	LOCAÇÃO DA OBRA	VALOR PREVISTO	16.103,88							16.103,88		16.103,88
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
4	MÓDULO 01 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	54.707,18	49.909,09						104.616,26		104.616,26
		PERCENTUAL PREVISTO	52,29%	47,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
4.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	13.919,24							13.919,24		13.919,24
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
4.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS e CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	37.747,55	37.747,55						75.495,10		75.495,10
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
4.3	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS e CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	3.040,38	12.161,53						15.201,92		15.201,92
		PERCENTUAL PREVISTO	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
5	MÓDULO 01 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO		42.359,87	95.678,56					138.038,43		138.038,43
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,69%	69,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
5.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO		25.239,27	25.239,27					50.478,54		50.478,54
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
5.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO		17.120,60	39.948,07					57.068,68		57.068,68
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
5.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO			30.491,22					30.491,22		30.491,22
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
6	MÓDULO 02 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	36.884,96	30.730,45						67.615,41		67.615,41
		PERCENTUAL PREVISTO	54,55%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
6.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	10.030,81							10.030,81		10.030,81
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
6.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS e CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	23.953,93	23.953,93						47.907,87		47.907,87
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										
6.3	PREPARO E BOTA-LOCA	VALOR PREVISTO	2.904,22	6.776,52						9.680,74		9.680,74
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										


ANEXO XI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180 D	195 D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7	MÓDULO 02 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO		34.874,61	76.492,50					111.367,11		111.367,11
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	31,31%	68,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO		22.385,45	22.385,45					44.770,90		44.770,90
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO		12.489,16	29.141,37					41.630,53		41.630,53
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO			24.965,68					24.965,68		24.965,68
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8	MÓDULO 03 - INFRA-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	43.507,83	31.030,00						74.537,83		74.537,83
		PERCENTUAL PREVISTO	58,37%	41,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	16.285,03							16.285,03		16.285,03
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS e CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	24.367,40	24.367,40						48.734,80		48.734,80
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.3	REATERRO E BOTA-FORA	VALOR PREVISTO	2.855,40	6.662,60						9.518,00		9.518,00
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9	MÓDULO 03 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO		29.990,17	64.002,68					93.992,85		93.992,85
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	31,91%	68,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO		20.318,17	20.318,17					40.636,34		40.636,34
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO		9.672,00	22.568,00					32.240,01		32.240,01
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO			21.116,50					21.116,50		21.116,50
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
10	PISOS E REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO				43.910,94	43.910,94			87.821,88		87.821,88
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
11	PAREDES E PAINÉIS	VALOR PREVISTO				388.714,22				388.714,22		388.714,22
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO										0,00%
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

[Handwritten signature]

ANEXO XI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
12	ACESSÓRIOS E FERRAGENS	VALOR PREVISTO					17.330,94	17.330,94	34.661,89		34.661,89
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
13	ESQUADRIAS E VIDROS	VALOR PREVISTO			141.643,22	141.643,22			283.286,44		283.286,44
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
14	FORRO	VALOR PREVISTO					26.750,36	26.750,36	53.500,71		53.500,71
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
15	REVESTIMENTO DE FACHADA	VALOR PREVISTO			125.682,67	502.730,69			628.413,36		628.413,36
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	VALOR PREVISTO	10.457,90	31.373,70	31.373,70	31.373,70	41.831,60	31.373,70	209.157,98		209.157,98
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
16.1	REDE DE ÁGUA FRIA	VALOR PREVISTO	1.630,68	4.892,05	4.892,05	4.892,05	6.522,74	4.892,05	32.613,69		32.613,69
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
16.2	REDE DE ESGOTO	VALOR PREVISTO	1.503,48	4.510,44	4.510,44	4.510,44	6.013,92	4.510,44	30.069,58		30.069,58
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
16.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO	VALOR PREVISTO	1.898,71	5.696,14	5.696,14	5.696,14	7.594,85	5.696,14	37.974,25		37.974,25
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
16.4	CAIXAS SIFONADAS E RALOS	VALOR PREVISTO	34,44	103,32	103,32	103,32	137,75	103,32	688,77		688,77
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
16.5	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	VALOR PREVISTO	2.914,92	8.744,76	8.744,76	8.744,76	11.659,68	8.744,76	58.298,40		58.298,40
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
16.6	RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS	VALOR PREVISTO	2.475,66	7.426,99	7.426,99	7.426,99	9.902,66	7.426,99	49.513,29		49.513,29
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR PREVISTO	17.976,98	53.930,94	53.930,94	53.930,94	71.907,92	53.930,94	359.539,58		359.539,58
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
17.1	LUMINÁRIAS	VALOR PREVISTO	4.977,15	14.931,44	14.931,44	14.931,44	19.908,59	14.931,44	99.542,95		99.542,95
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
17.2	ILUMINAÇÃO	VALOR PREVISTO	3.462,89	10.388,67	10.388,67	10.388,67	13.851,56	10.388,67	69.257,82		69.257,82
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
17.3	REDE DE BAIXA TENSÃO TOMADAS	VALOR PREVISTO	1.122,51	3.367,53	3.367,53	3.367,53	4.490,03	3.367,53	22.450,17		22.450,17
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%

Handwritten initials and signature:


ANEXO XI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180 D	195 D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17.4	REDE DE BAIXA TENSÃO	VALOR PREVISTO	1.409,41	4.228,23	4.228,23	4.228,23	5.637,64	4.228,23	4.228,23	28.188,21	28.188,21
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17.5	INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA	VALOR PREVISTO	219,23	657,70	657,70	657,70	876,93	657,70	657,70	4.384,66	4.384,66
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17.6	ALIMENTADORES	VALOR PREVISTO	3.564,22	10.692,66	10.692,66	10.692,66	14.256,88	10.692,66	10.692,66	71.284,41	71.284,41
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17.7	ELETRICA - EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	3.221,57	9.664,71	9.664,71	9.664,71	12.886,27	9.664,71	9.664,71	64.431,37	64.431,37
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	VALOR PREVISTO	2.985,47	8.956,41	8.956,41	8.956,41	11.941,89	8.956,41	8.956,41	59.709,43	59.709,43
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18.1	REDE - LÓGICA E TELEFONIA	VALOR PREVISTO	1.282,19	3.846,57	3.846,57	3.846,57	5.128,76	3.846,57	3.846,57	25.643,78	25.643,78
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18.2	INFRA ESTRUTURA - LÓGICA TELEFONIA E CFTV	VALOR PREVISTO	378,73	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.514,93	1.136,20	1.136,20	7.574,67	7.574,67
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18.3	LÓGICA - EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	878,47	2.635,41	2.635,41	2.635,41	3.513,89	2.635,41	2.635,41	17.569,43	17.569,43
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18.4	REDE DE CFTV	VALOR PREVISTO	146,06	438,17	438,17	438,17	584,23	438,17	438,17	2.921,16	2.921,16
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18.5	INFRA ESTRUTURA - SOM, VIDEO E CHAMADA DE SENHA	VALOR PREVISTO	130,75	392,24	392,24	392,24	522,99	392,24	392,24	2.614,94	2.614,94
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18.6	ENTRADA LOGICA E TELEFONIA	VALOR PREVISTO	169,27	507,82	507,82	507,82	677,09	507,82	507,82	3.385,45	3.385,45
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	2.361,11	7.083,33	7.083,33	7.083,33	9.444,44	7.083,33	7.083,33	47.222,22	47.222,22
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19.1	INFRA ESTRUTURA - AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	2.146,59	6.439,78	6.439,78	6.439,78	8.586,37	6.439,78	6.439,78	42.931,85	42.931,85
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19.2	DRENO - AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	214,52	643,56	643,56	643,56	858,07	643,56	643,56	4.290,37	4.290,37
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

ANEXO XI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALGR	1,00	VALOR COM KAPA
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.1	ALVENARIA	VALOR PREVISTO			53.990,88	134.977,20	53.990,88	26.995,44	269.954,41		269.954,41
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.2	REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO			10.065,23	25.163,07	10.065,23	5.032,61	50.326,14		50.326,14
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.3	PINTURA ÁREA EXTERNA	VALOR PREVISTO			6.672,99	16.682,48	6.672,99	3.336,50	33.364,96		33.364,96
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.4	FECHAMENTOS EXTERNOS	VALOR PREVISTO			13.431,24	33.578,09	13.431,24	6.715,62	67.156,18		67.156,18
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.5	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E DEPOSITÁRIO	VALOR PREVISTO			29.125,30	72.813,25	29.125,30	14.562,65	145.626,50		145.626,50
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.6	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO E CASA DE BOMBAS	VALOR PREVISTO			11.479,56	28.698,89	11.479,56	5.739,78	57.397,78		57.397,78
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	VALOR PREVISTO			24.362,07	60.905,16	24.362,07	12.181,03	121.810,33		121.810,33
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.8	ELEMENTOS DECORATIVOS	VALOR PREVISTO			702,87	1.757,18	702,87	351,44	3.514,37		3.514,37
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.9	PAISAGISMO	VALOR PREVISTO			3.481,30	8.703,24	3.481,30	1.740,65	17.406,48		17.406,48
		PERCENTUAL PREVISTO			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
30	ADMINISTRAÇÃO	VALOR PREVISTO	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	18.837,91	244.892,84		244.892,84
		PERCENTUAL PREVISTO	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	7,69%			100,00%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	839.584,43	357.914,39	375.193,95	1.092.338,11	1.471.490,03	687.798,97	477.250,96	5.301.570,84	4.453.319,50
		PERCENTUAL PREVISTO	15,84%	6,75%	7,06%	20,60%	27,76%	12,97%	9,00%	TOTAL DA OBRA	100%
		VALOR REALIZADO									
		PERCENTUAL REALIZADO		22,59%	29,66%	50,27%	78,02%	91,00%	100,00%		

R
/

EMPREENDIMENTO: e Construção do Novo Fórum da Comarca de Lapão, localizado na Zona Urbana entre as ruas Rui Barbosa - José Gregório - Rogaciano Barbosa, s/n, município de Lapão/BA

ITEM	SERVIÇOS	PLANEJAMENTO							
		Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PLANEJADO							
		REALIZADO							
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
3	LOCAÇÃO DA OBRA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
4	MÓDULO 1 - INFRAESTRUTURA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
5	MÓDULO 1 - SUPER-ESTRUTURA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
6	MÓDULO 2 - INFRAESTRUTURA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
7	MÓDULO 2 - SUPER-ESTRUTURA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
8	MÓDULO 3 - INFRAESTRUTURA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
9	MÓDULO 3 - SUPER-ESTRUTURA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
10	PISOS E REVESTIMENTO	PLANEJADO							
		REALIZADO							
11	PAREDES E PAINÉIS	PLANEJADO							
		REALIZADO							
12	ACESSÓRIOS E FERRAGENS	PLANEJADO							
		REALIZADO							
13	ESQUADRIAS E VIDROS	PLANEJADO							
		REALIZADO							
14	FORRO	PLANEJADO							
		REALIZADO							
15	REVESTIMENTO DA FACHADA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	PLANEJADO							
		REALIZADO							
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PLANEJADO							
		REALIZADO							
18	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA	PLANEJADO							
		REALIZADO							
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	PLANEJADO							
		REALIZADO							
20	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PLANEJADO							
		REALIZADO							

E 9/10

ITEM	SERVIÇOS	PLANEJAMENTO						
		Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
21	SPDA	PLANEJADO						
		REALIZADO						
22	GERAÇÃO DE ENERGIA	PLANEJADO						
		REALIZADO						
23	ARREMATAS E SOLEIRA	PLANEJADO						
		REALIZADO						
24	PINTURA	PLANEJADO						
		REALIZADO						
25	COBERTURA	PLANEJADO						
		REALIZADO						
26	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	PLANEJADO						
		REALIZADO						
27	SINALIZAÇÃO	PLANEJADO						
		REALIZADO						
28	LIMPEZA GERAL	PLANEJADO						
		REALIZADO						
29	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	PLANEJADO						
		REALIZADO						
30	ADM	PLANEJADO						
		REALIZADO						


LEGENDA: PLANEJADO REALIZADO ATRASADO

E. J. G.

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA TOTAL

Contrato:
Objeto:

TJ BA Empresa: REICH ENGENHARIA LTDA - ME
Construção do Novo Fórum da Comarca de Lapão, localizado na Zona Urbana, s/n, município de Lapão/BA

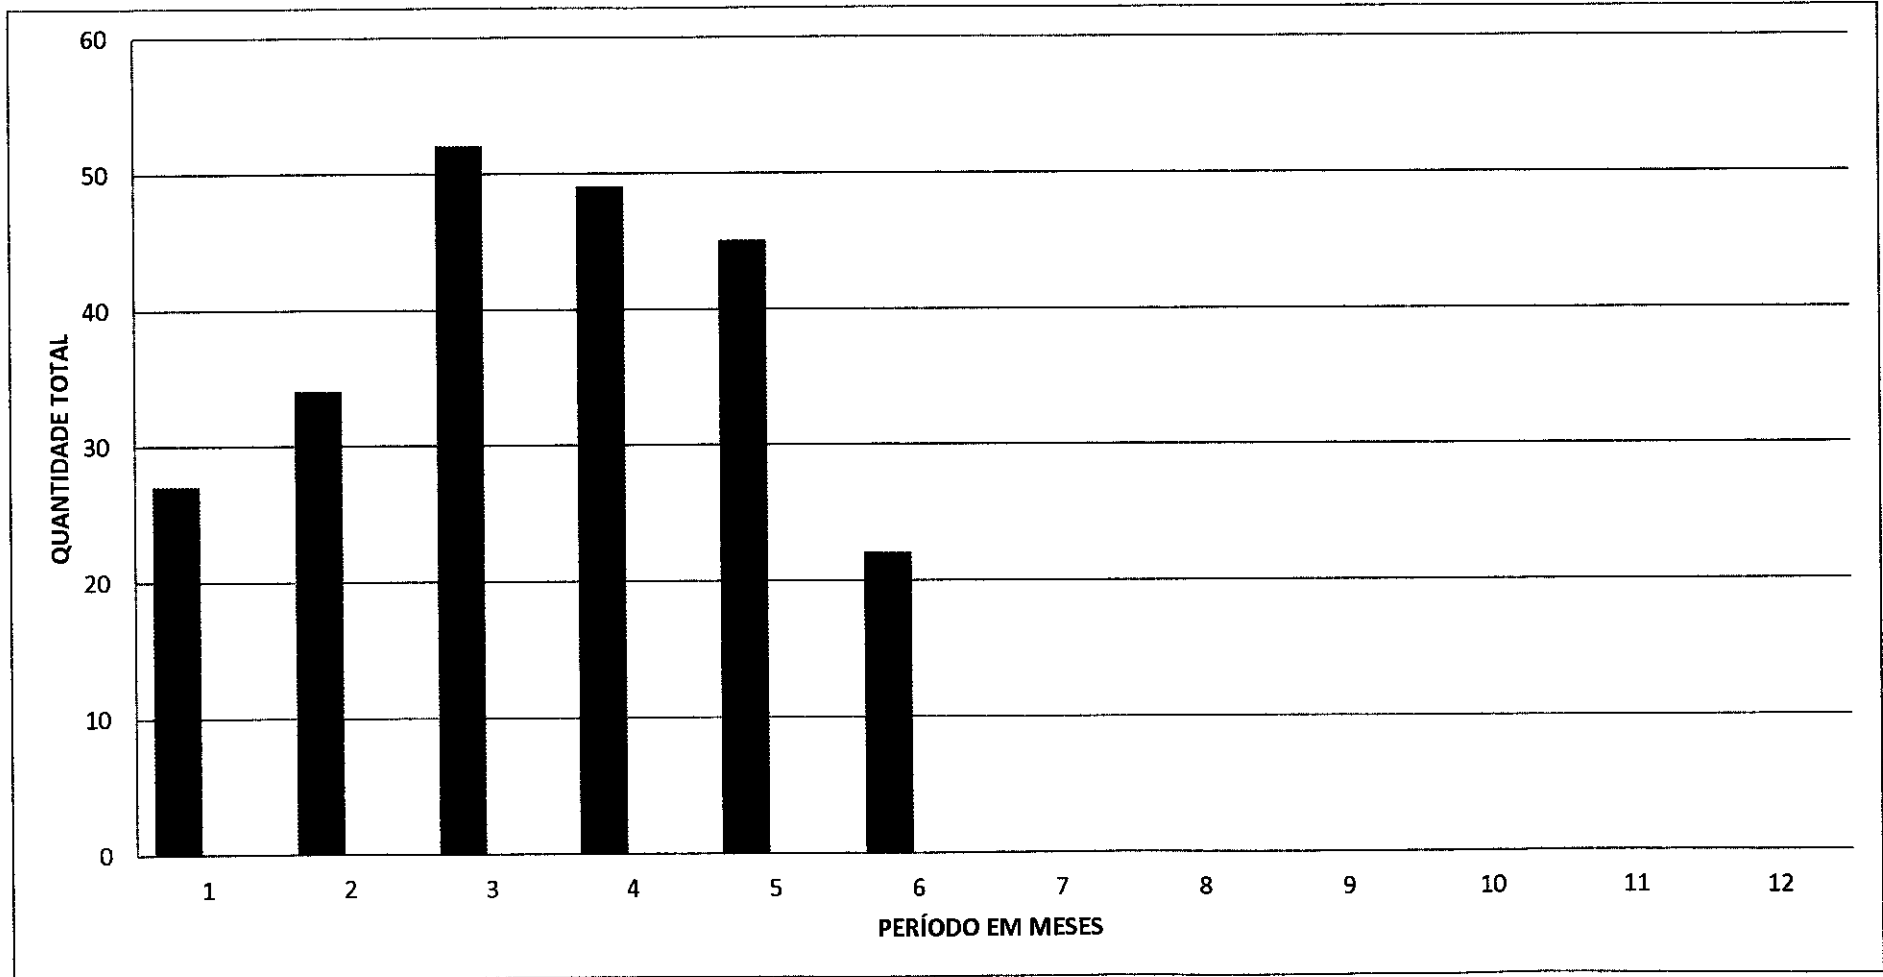

R
1/04

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

Contrato:	TJ-BA	Empresa:	REICH ENGENHARIA
Objeto:	Construção do Novo Fórum da Comarca de Lapão, localizado na Zona Urbana, s/n, município de Lapão/BA		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO CBO	PREV	QUANTIDADE PREVISTA NO PERÍODO DE DIAS											
			REAL	30	60	90	120	150	185	210	240	270	300	330	360
1	Ajudante	7170-20	PREV	1	5	5	5	2	1						
			REAL												
2	Almoxarife	4141-05	PREV	2	2	2	2	2	2						
			REAL												
3	Apontador	4142-05	PREV	1	1	1	1	1	1						
			REAL												
4	Armador	7153-15	PREV	3	3	3									
			REAL												
5	Auxiliar de Escritório	4110-05	PREV	1	1	1	1	1	1						
			REAL												
6	Auxiliar de Topografia	3123-20	PREV	1											
			REAL												
7	Azulejista	7165-10	PREV			6	6	6							
			REAL												
8	Bombeiro Hidráulico	7241-10	PREV			6	6	6							
			REAL												
9	Carpinteiro	7155-05	PREV	3	3	3									
			REAL												
10	Eletricista	9511-05	PREV	1	2	3	3	2	1						
			REAL												
11	Encarregado Geral, Mestre de Obras	7102-05	PREV	1	1	1	1	1	1						
			REAL												

R
 JG


HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

Contrato:	TJ-BA	Empresa:	REICH ENGENHARIA
Objeto:	Construção do Novo Fórum da Comarca de Lapão, localizado na Zona Urbana, s/n, município de Lapão/BA		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO CBO	PREV	QUANTIDADE PREVISTA NO PERIODO DE DIAS											
			REAL	30	60	90	120	150	185	210	240	270	300	330	360
12	Engenheiro Civil	2142-05	PREV	1	1	1	1	1	1						
			REAL												
13	Operador de Máquina	7151-20	PREV	2	2	2	2	2	2						
			REAL												
14	Pedreiro	7152-10	PREV	3	6	6	6	6	3						
			REAL												
15	Pintor	7166-10	PREV			3	6	6	3						
			REAL												
16	Serralheiro	7244-40	PREV			3	3	3							
			REAL												
17	Técnico em Edificações	3121-05	PREV	1	1	1	1	1	1						
			REAL												
18	Técnico em Segurança do Trabalho	3516-05	PREV	1	1	1	1	1	1						
			REAL												
19	Topógrafo	3123-20	PREV	1	1										
			REAL												
20	Vigia	5174-20	PREV	4	4	4	4	4	4						
			REAL												
	TOTAL DE PESSOAL		PREV	27	34	52	49	45	22	0	0	0	0	0	0
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ORGANOGRAMA

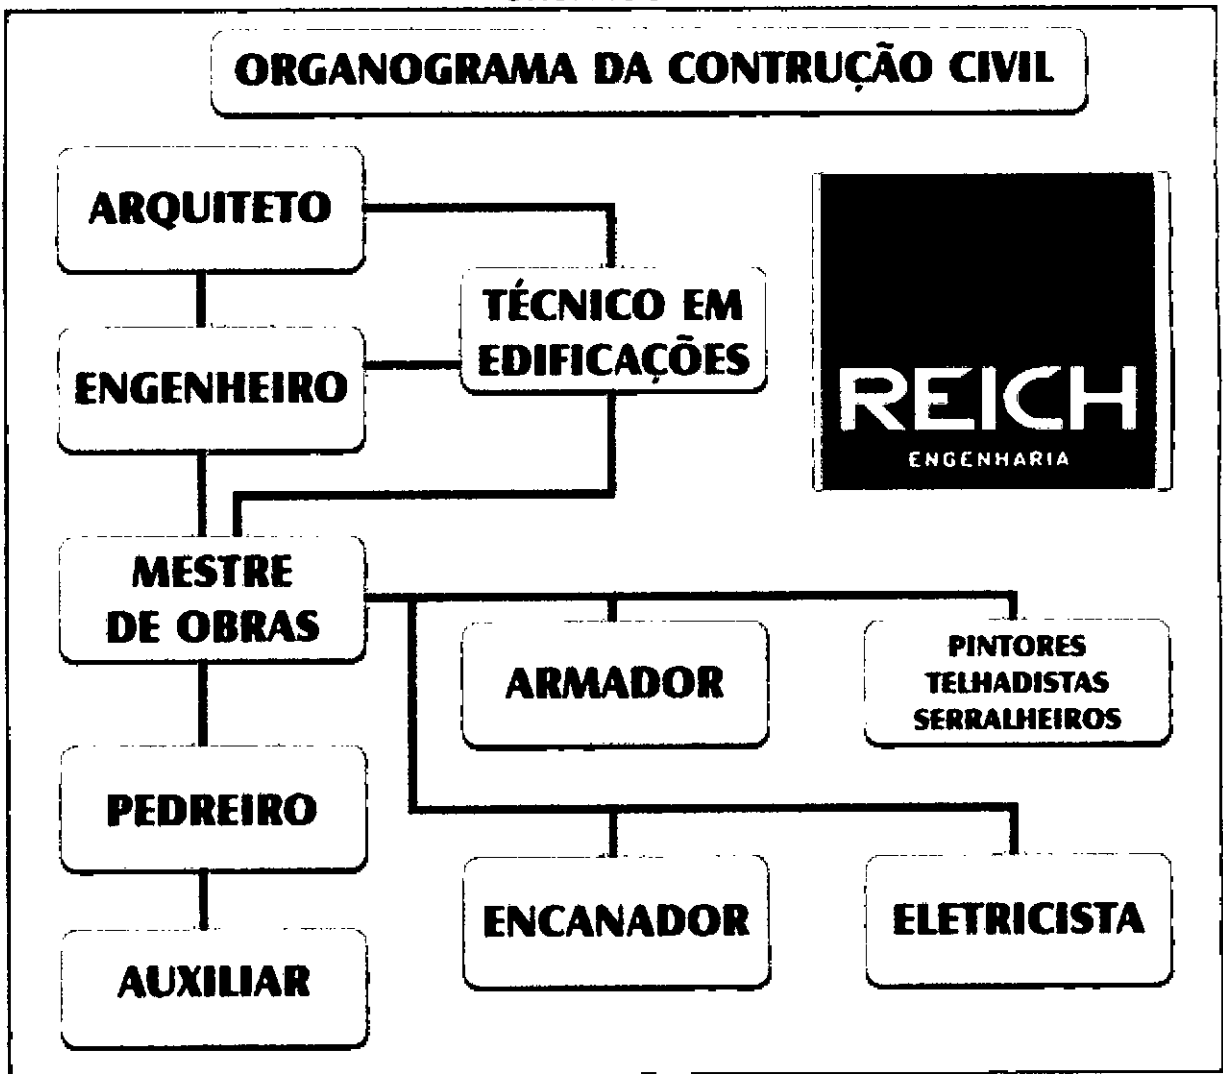

Lauro de Freitas/BA, 29 de Junho de 2022.

NICOLAS MOREIRA FASCETO

Representante Legal C.I. N.º 574565183 C.P.F. N.º 012.711.295-23

MAGNO BITTENCOURT ROCHA

Representante Legal C.I. N.º 869800922 C.P.F. N.º 010.612.365-36

Rua Carlos Alberto de Oliveira, n.º 186 Lot. Stª Julia – Quadra D – Bairro Itinga

CEP: 42700-130 – Lauro de Freitas - Bahia
